


Den 29. november 2018

Kålmarken  
Att. Anne Lorentzen  
Strandløkken 18  
2791 Dragør  
Tlf: 26 20 62 59

### **Badebro, Dragør**

#### **BESKRIVELSE**

Badebroen er opbygget af 13 moduler á 1,5 X 3,0 meter. Badebroen er i alt 39 meter lang. Hertil kommer 2 moduler á 1,5 X 3,0 meter, der kan bruges som platform eksempelvis ved at montere dem side om side med det yderste modul, således der dannes en platform på 4,5 X 3,0 meter enden af broen. Broen består af i alt 15 moduler. Modulerne er udført i saltvandsbestandig aluminium og med et dæk af imprægneret fyrretræ. Pæle (Ø60 mm.) af saltvandsbestandig aluminium. Pælene bankes i bunden, der monteres stivere på tværs og langs efter behov for at sikre stabiliteten.

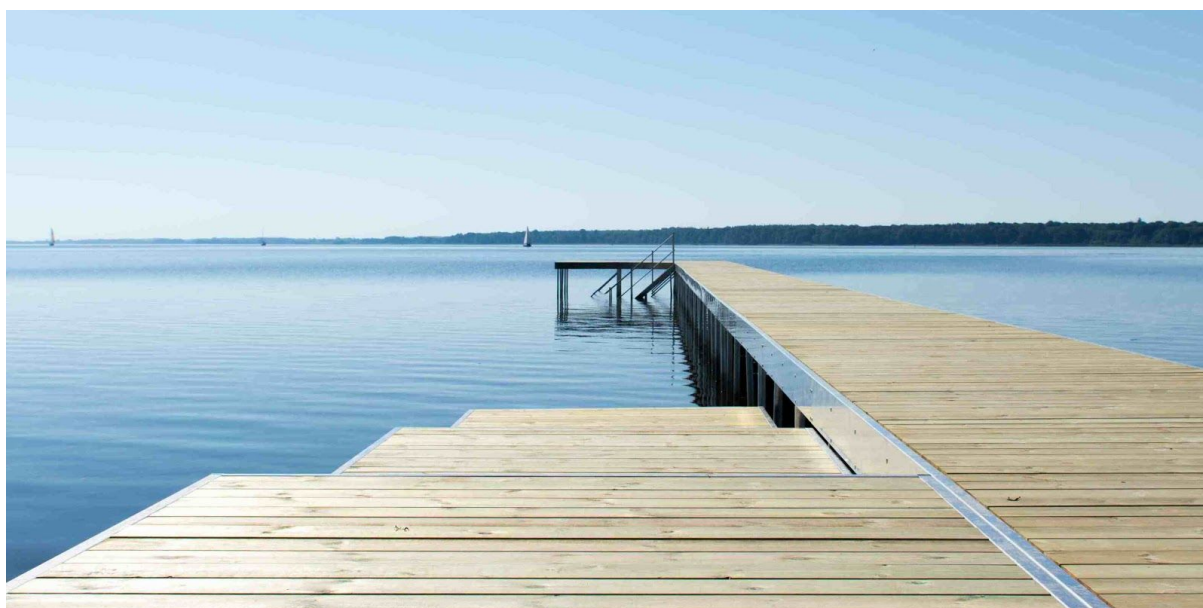

*Pro-Bro er kendt for vores vedligeholdelsesfrie bade- og bådebroer. På billedet ses en badebro, vi har leveret til Horsens Kommune i maj 2016. Badebroen på billedet har et dæk af fyrretræ.*

#### **PRIS**

Badebro iht. ovenstående beskrivelse	136.500,00 DKK
Levering til kundens adresse som anført i dette tilbud, 15 moduler á 1,5 x 3,0 meter	11.000,00 DKK

Opsætning 15 moduler á 1,5 x 3,0 meter*	56.250,00 DKK
Badetrappe af alu med gelænder i begge sider/stk.	6.800,00 DKK
Bænk af alu og fyrretræ (bredde 1,2 meter) til montering på bro/2 stk.	10.400,00 DKK
I alt ekskl. moms	220.950,00 DKK
Moms 25%	55.237,50 DKK
<b>I alt inkl. moms</b>	<b>276.187,50 DKK</b>

*\*Estimeret pris. Ekskl. kørsel iht. statens takster, evt. broafgift og/eller færgeudgift. Ekskl. fjernelse og bortskaffelse af evt. eksisterende bro. Prisen tager udgangspunkt i, at der er adgang til el, en max. vanddybde på 1,5 meter samt grunden er ryddet, så broen kan opsættes uden, at vi skal fjerne sten, bevoksning såsom træer, rødder, siv og lign. Der tages forbehold for vind og vejr, som i nogle tilfælde kan forlænge opsætningen. Vores montør ønsker at besigtige forholdene, inden vi afgiver en endelig pris på opsætning/nedtagning.*

## OPTIONER

	Ekskl. moms	Inkl. moms
Merpris for lærk i stedet for fyrretræ/15 stk. moduler (1,5 X 3,0 meter)	10.500,00 DKK	13.125,00 DKK
Merpris for vedligeholdelsesfrit komposit (farve: sort) i stedet for fyrretræ/15 stk. moduler (1,5 X 3,0 meter)	30.000,00 DKK	37.500,00 DKK

**LEVERINGSTID:** 8-9 arbejdsuger fra ordren er afgivet og forskudsbetalingen er modtaget. Evt. opsætningsdato aftales med kunden.

**LEVERINGSBETINGELSER:** Ab fabrik, 8543 Hornslet, med mindre andet er aftalt.

**BETALINGSBETINGELSER:** 40% forskudsbetaling af totalbeløbet ved ordre og de resterende 60% ved levering/afhentning, 7 dage netto. Levering/afhentning skal finde sted senest 2 uger efter klarmelding af ordren.

Ejendomsretten til det leverede forbliver hos Pro-Bro ApS indtil totalbeløbet anført i tilbuddet/ordren er betalt.

**GYLDIGHED:** Tilbuddet er gyldigt i 90 dage fra dato, hvorefter det bortfalder. Priser og betingelser kan ændres uden forudgående varsel indtil ordren er afgivet.

**TILLADELSE:** Kunden gøres hermed opmærksom på der skal søges om tilladelse, hos kommunen, til etablering af broen. Det er til enhver tid kundens ansvar, at der foreligger en godkendelse på etableringen.

**GARANTI:** 2 år på materiale- og produktionsfejl. Pro-Bro ApS kan ikke drages til ansvar for skader forvoldt af vind og vejr.

Har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen  
Christian B. Petersen

**Pro-Bro ApS**

- gå på vandet

M: +45 42 70 90 19

E: [christian@pro-bro.dk](mailto:christian@pro-bro.dk)

W: [Pro-Bro.dk](http://Pro-Bro.dk)

Foto: [Pro-Bro på Facebook](#)

Video: [Pro-Bro på YouTube](#)
